

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 15 juin 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

• TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN :

- Construction de routes: Les travaux de construction sont globalement terminés, à l'exception de mises à niveau mineures à quelques endroits.
- Dynamitage: Les activités de dynamitage seront localisées à certains endroits pour la finition.
- Poste électrique: Tests des équipements et branchements dans le bâtiment de contrôle
- Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: Le bétonnage est en cours pour les fondations du secteur sud à partir du plan de béton temporaire.
- Réseau collecteur: Travaux dans la branche I.

• **LIVRAISONS:** Neuf livraisons quotidiennes de composantes au chantier.

• **FERMETURE DE ROUTE:** Certaines routes dans le secteur nord seront fermées temporairement dû aux livraisons et aux travaux sur le réseau collecteur.

• **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Transport des composantes

Après le dégel (fin mai à mi-juin)

- Du lundi au vendredi, trois transports de composantes (nacelle, moyeu et groupe motopropulseur), entre 6h et 8h.
 - Du site d'entreposage sur le Chemin de la Rivière Verte vers le nord, la route de la Station vers l'ouest et la Route des Roches vers le Sud.
- Du lundi au vendredi, 6 transports de sections de tours en provenance de Matane.
 - Via la sortie 85 de l'autoroute 85, et la Route des Roches vers le sud.

Période estivale (mi-juin à fin août)

- Du lundi au vendredi, selon les mêmes horaires et trajets que plus haut, sauf le 24 juin, le 3 juillet et du 20 au 31 juillet:
 - Trois transports de pales
 - Trois transports de composantes (nacelle, moyeu et groupe motopropulseur)
 - Six transports de sections de tours (complété à la mi-juillet)


Rappel des règles de sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Respectez la signalisation, les limites de vitesse ainsi que les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler près de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
98%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
84%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
54%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
29%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
82%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
32%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

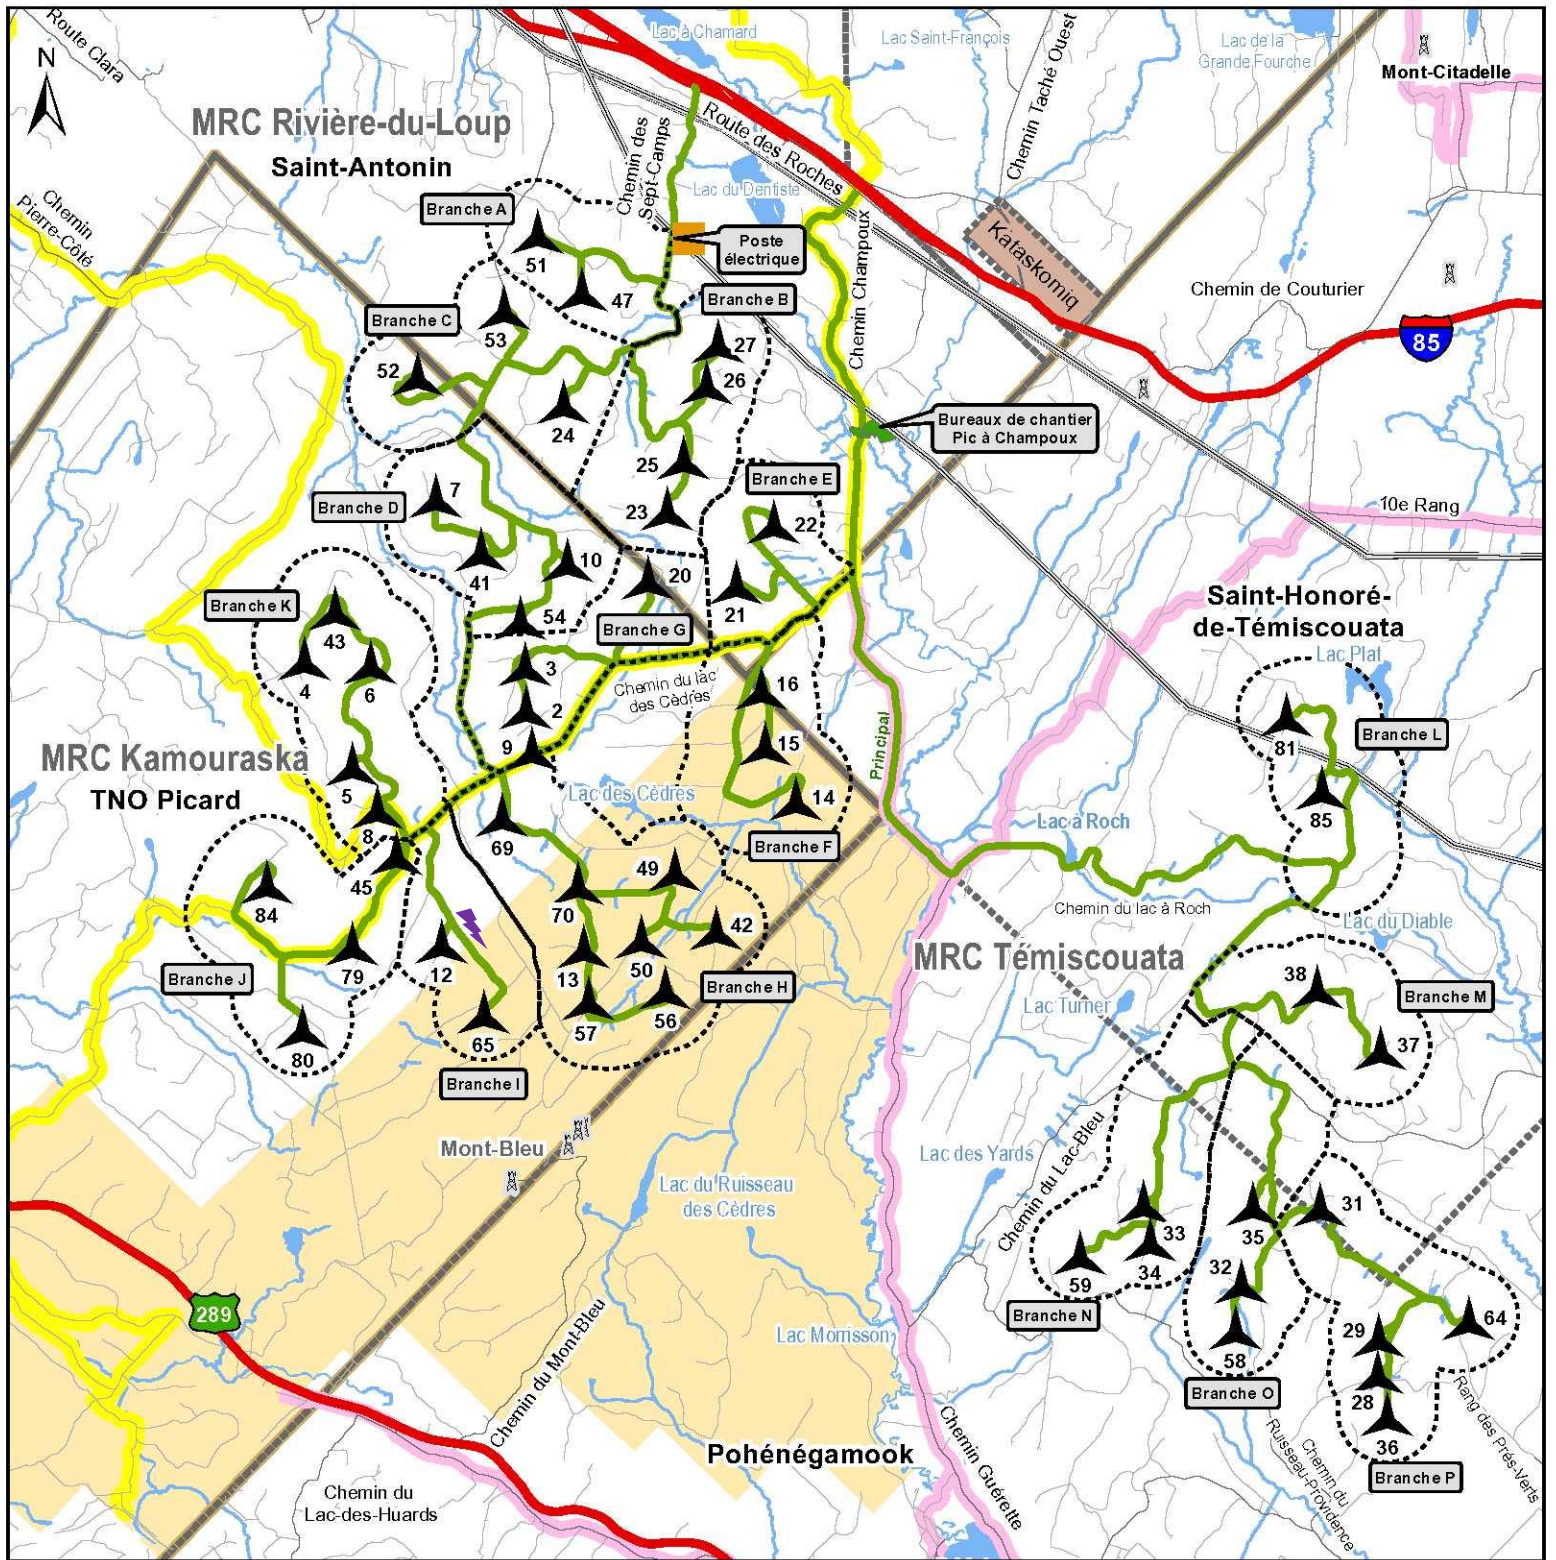

Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur
