

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 28 septembre 2026

**Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk**

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours

• TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN:

- Construction de routes: L'entretien des routes se fait de façon continue pour le contrôle de la poussière et autres réparations mineures.
- Poste électrique: En attente de la mise sous tension initiale d'Hydro-Québec.
- Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: le montage des éoliennes se poursuit avec 4 grues principales.
- Réseau collecteur: **ENTRAVES MAJEURES** dans la Main West, la Main Central et le Chemin Principal. Les véhicules seront autorisés à circuler une fois toutes les 30 minutes.

• LIVRAISONS: Dernière livraison de tour le 8 septembre.

• FERMETURE DE ROUTE: Certaines routes seront fermées temporairement dû aux livraisons et aux travaux sur le réseau collecteur.

• ACCÈS LIMITÉ: Dans les zones de construction et selon la signalisation



Semaine de chasse à l'orignal à l'arme à feu

Les activités de construction au chantier seront interrompues durant la semaine de chasse à l'orignal à l'arme à feu, du 17 au 25 octobre. Aucune activité d'assemblage d'éolienne, de travaux civils et d'installation du réseau collecteur ne seront en cours.

Des équipes réduites circuleront de jour, entre 9h et 19h, pour des inspections de sécurité, des vérifications et l'accomplissement de certaines tâches à l'intérieur des éoliennes. L'infirmier restera fonctionnelle et des agents de sécurité seront présents au chantier.


Les règles de sécurité entourant l'utilisation des armes de chasse doivent d'ailleurs être respectées comme il se doit sur le territoire, il en va d'une question de respect et de sécurité de tous les utilisateurs du secteur.

Toute l'équipe vous souhaite une belle semaine de chasse et vous invite à la prudence!

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
100%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
100%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
99%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
72%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
95%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
84%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

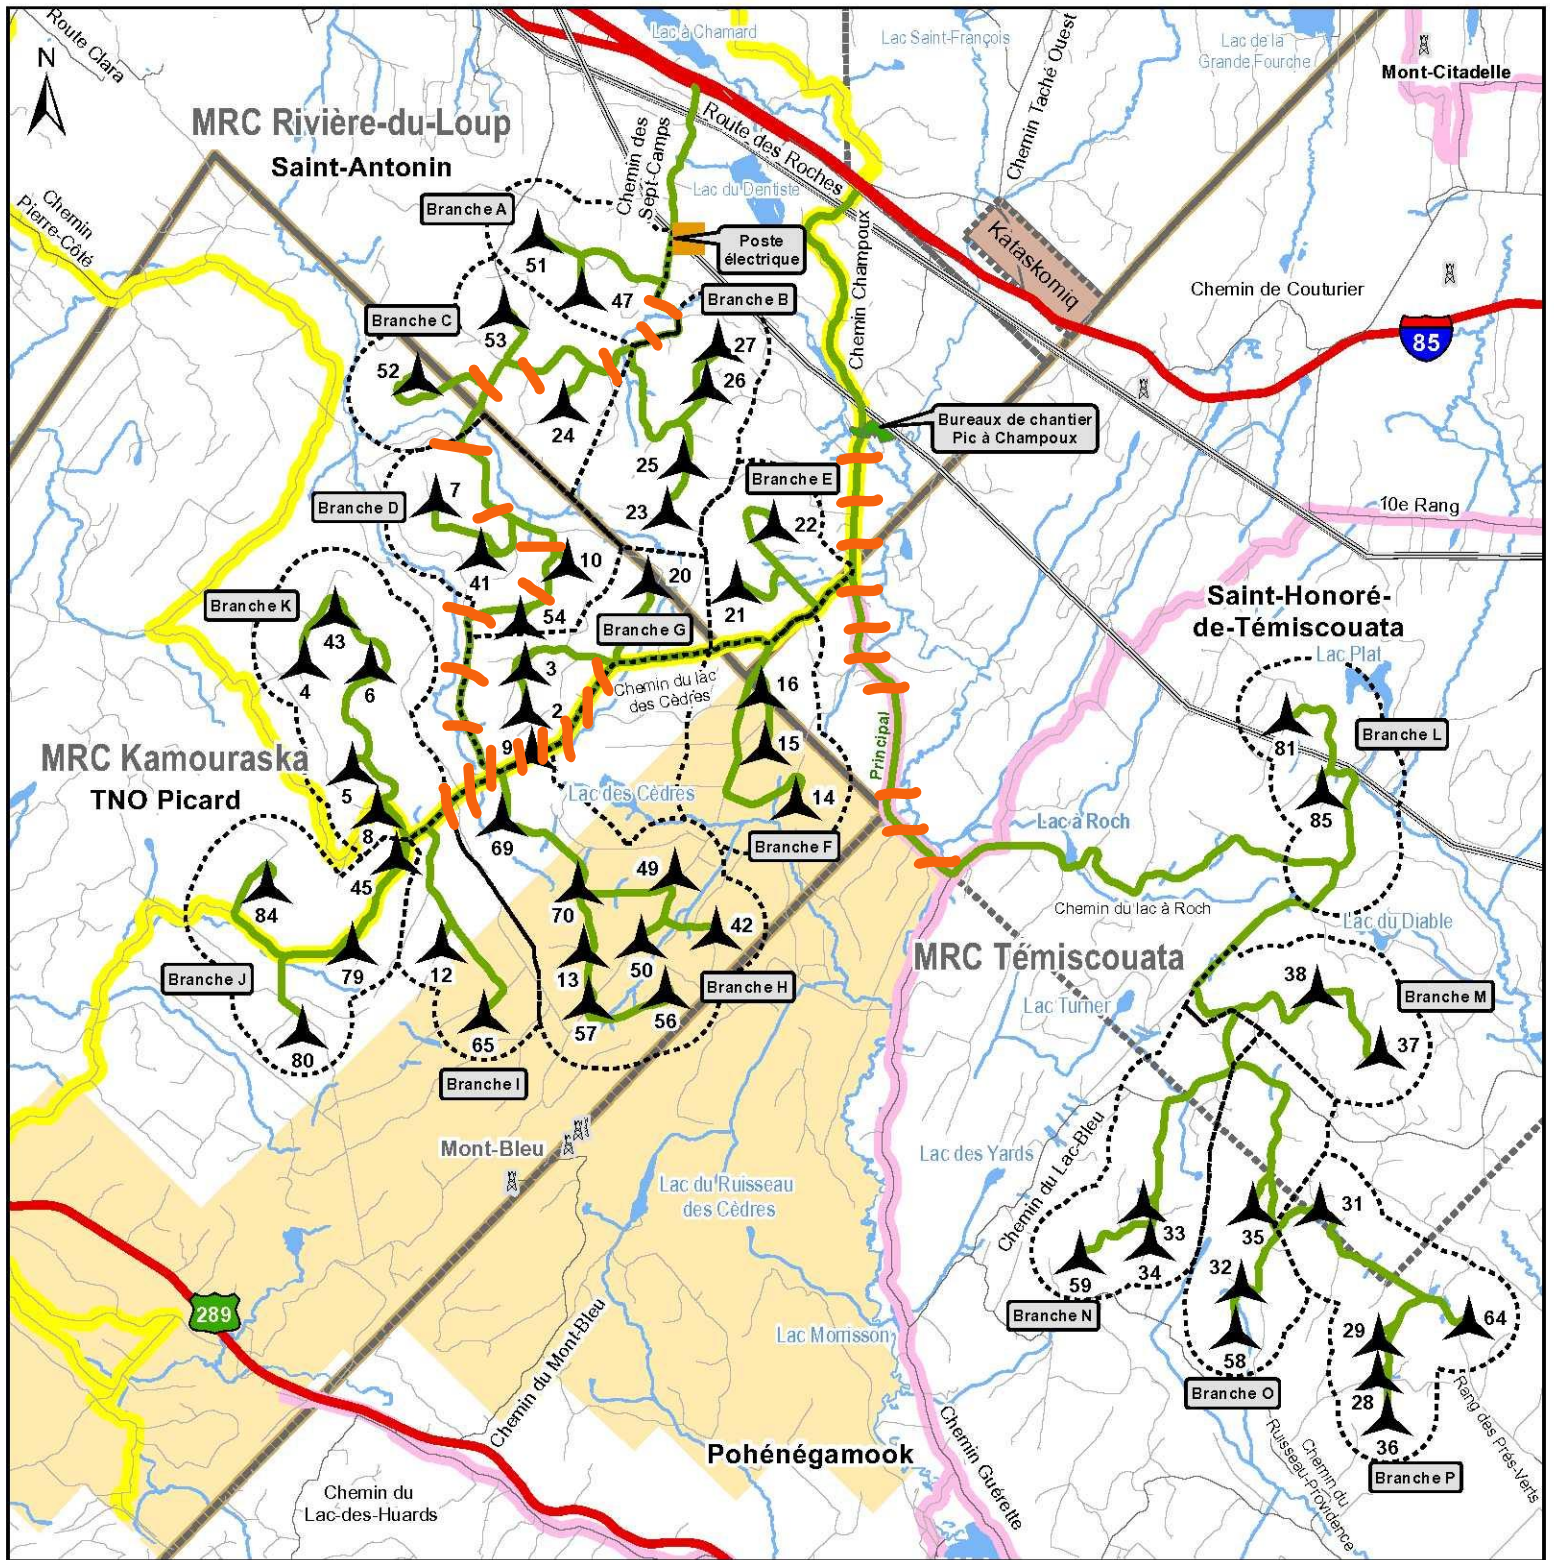

Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- ▲ Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- ✕ Fondations (branches)
- ⚡ Réseau collecteur
