Invenergy ALLIANCE DE L'EST

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 15 septembre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

- **TRAVAUX CIVILS:**
  - Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau): branches E, I, J, K, L et chemin du Lac à Roch
  - Dynamitage: branches K et L
  - Travaux de fondations au poste électrique
  - Construction de ligne électrique par Hydro-Québec
  - Travaux aux sites des fondations des éoliennes des branches A, B, C, E, F, G, H, I, J et K
  - Réseau collecteur: entre la route des Roches et le poste électrique
- **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur l'aire d'entreposage sur le Chemin de la Rivière Verte **(retour à l'horaire régulier)** et sur quelques aires d'éoliennes
- **FERMETURE DE ROUTE**: Chemin du Lac à Roch fermé du 2 au 15 septembre pour construction de traverse de cours d'eau. Détours possibles chemin sud vers Pohénégamook et via érablière des Potvin + accès via route des Roches – chemin de Couturier – rang 10.
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation

Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables

CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	**Déboisement**	Hiver 2025
51%	**Chemins**	Printemps 2025 – Été 2026
24%	**Fondations des éoliennes**	Printemps 2025 – Été 2025
28%	**Livraison des composantes**	Printemps 2025 – Été 2026
6%	**Réseau collecteur**	Été 2025 – Automne 2026
12%	**Poste de raccordement**	Été 2025 – Été 2026
0%	**Montage des éoliennes**	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

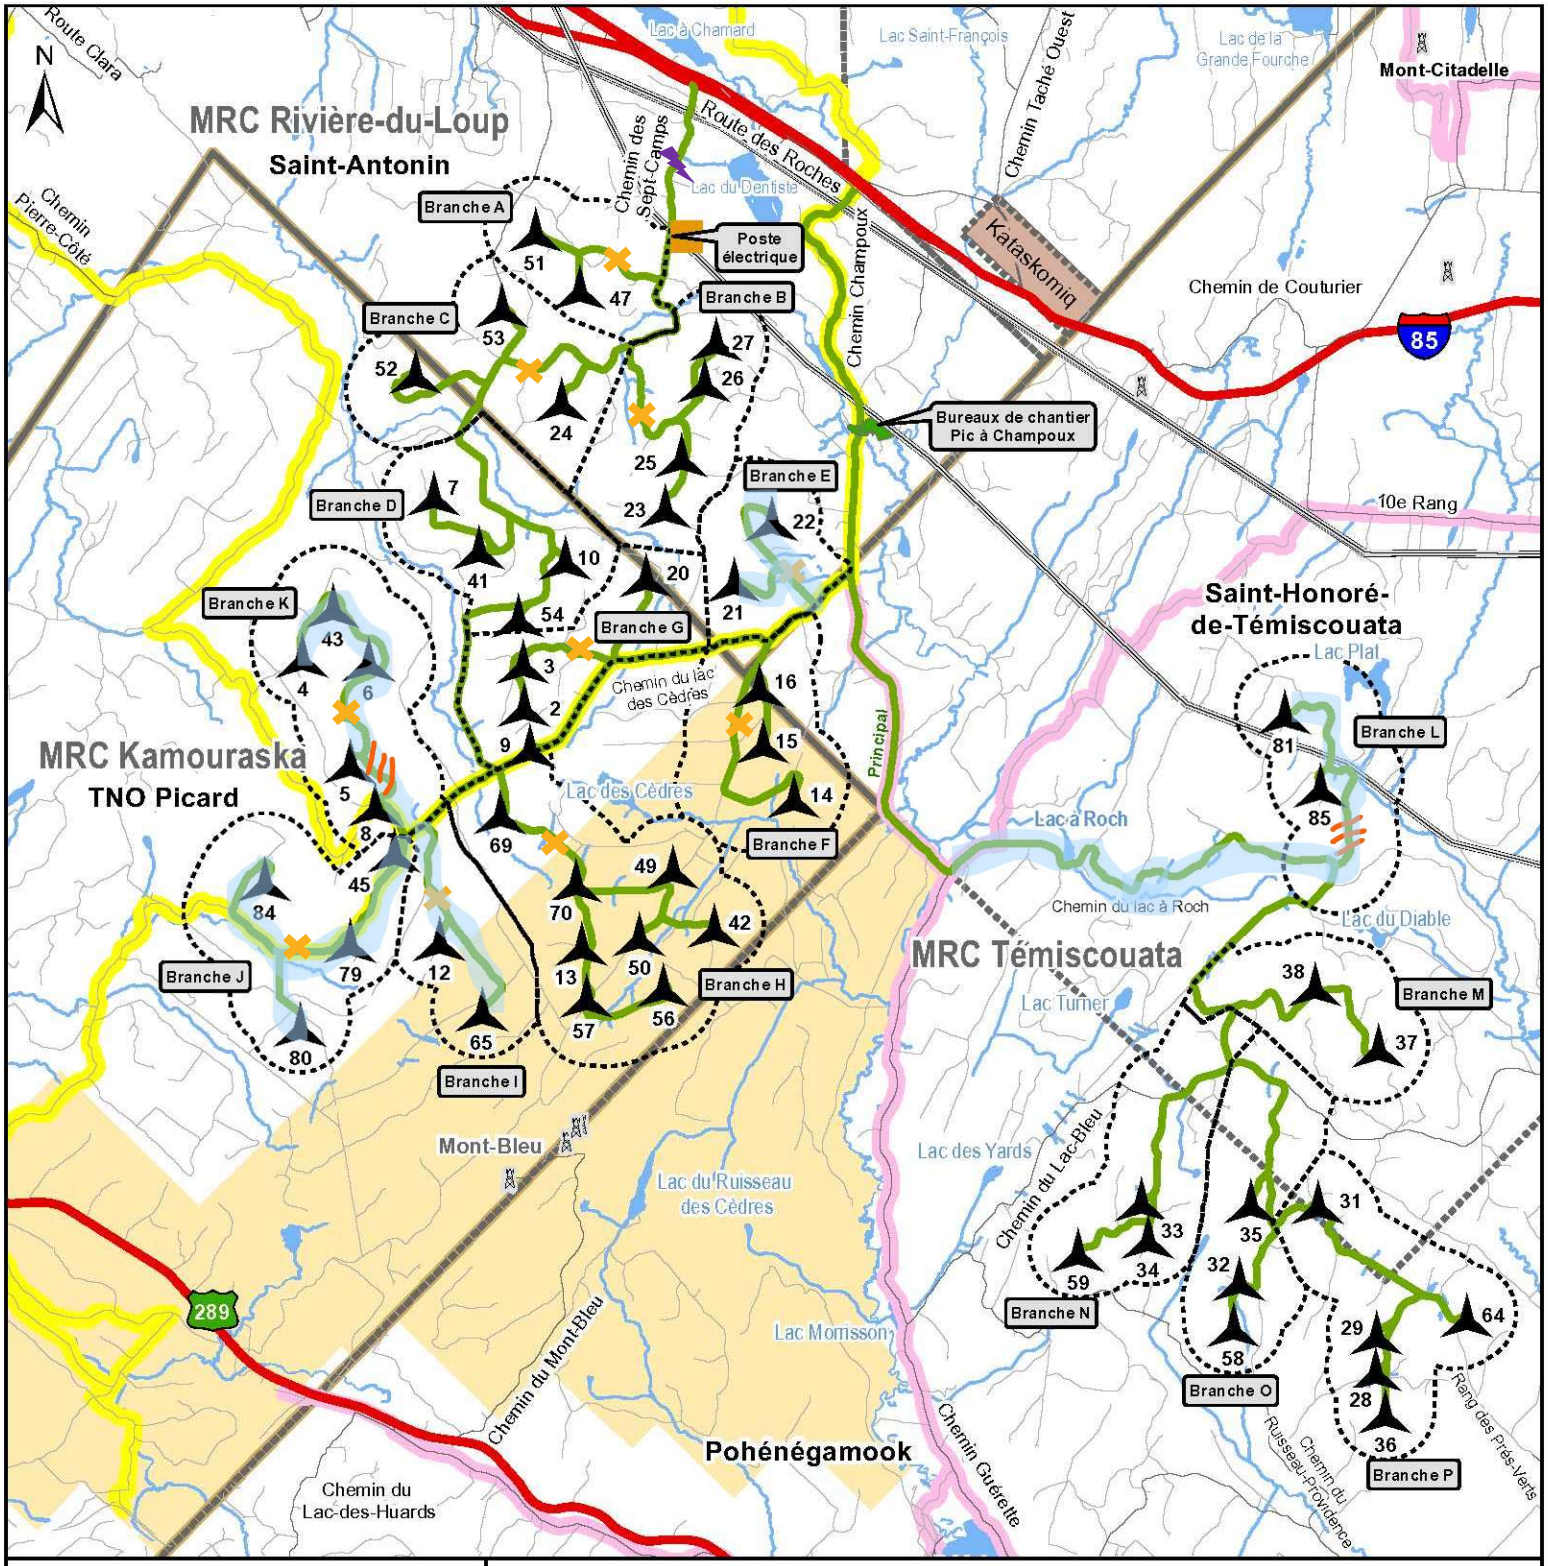

Invenergy

Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Plan de localisation

Poste électrique
Éolienne
Chemin d'accès
Secteur d'intervention (branche)
Ligne de transport d'énergie
Chemin forestier
Route régionale
Route locale
Cours d'eau à écoulement permanent
Plan d'eau
Territoire de Parke
Limite municipale
Limite de MRC
Sentier de VTT
Club Quad Trans-Témis
Club VTT l'Est-Quad
Travaux routiers
Zone de vigilance
Fondations (branches)
Réseau collecteur

0 1 2 4 Kilomètres

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7 *2025-06-05*

N/Réf.: PPAW_034B_WeeklyReports_20250605
