Invenergy ALLIANCE DE L'EST

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 19 octobre 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: voir encadré sur la semaine de chasse

- **TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN:**
  - Construction de routes: L'entretien des routes se fait de façon continue pour des réparations mineures.
  - Poste électrique: La mise sous tension initiale d'Hydro-Québec est complétée. Au fil des tests menant au début des opérations commerciales, les éoliennes vont commencer à tourner.
  - Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: En pause durant la semaine de chasse.
  - Réseau collecteur: En pause durant la semaine de chasse.
- **FERMETURE DE ROUTE**: Aucune fermeture durant la semaine de chasse.
- **ACCÈS LIMITÉ**: Dans les zones de construction et selon la signalisation.



Semaine de chasse à l'orignal à l'arme à feu

Les activités de construction au chantier seront interrompues durant la semaine de chasse à l'orignal à l'arme à feu, du 17 au 25 octobre. Aucune activité d'assemblage d'éolienne, de travaux civils et d'installation du réseau collecteur ne seront en cours.

Des équipes réduites circuleront de jour, entre 9h et 19h, pour des inspections de sécurité, des vérifications et l'accomplissement de certaines tâches à l'intérieur des éoliennes. L'infirmerie restera fonctionnelle et des agents de sécurité seront présents au chantier.


Les règles de sécurité entourant l'utilisation des armes de chasse doivent d'ailleurs être respectées comme il se doit sur le territoire, il en va d'une question de respect et de sécurité de tous les utilisateurs du secteur.

Toute l'équipe vous souhaite une belle semaine de chasse et vous invite à la prudence!

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	***Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)***	
100%	***Chemins***	Printemps 2025 – Été 2026
100%	***Fondations des éoliennes***	Printemps 2025 – Été 2026
100%	***Livraison des composantes sur le site***	Printemps 2025 – Été 2026
100%	***Poste de raccordement***	Été 2025 – Été 2026
76%	**Réseau collecteur**	Été 2025 – Automne 2026
89%	**Montage des éoliennes**	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

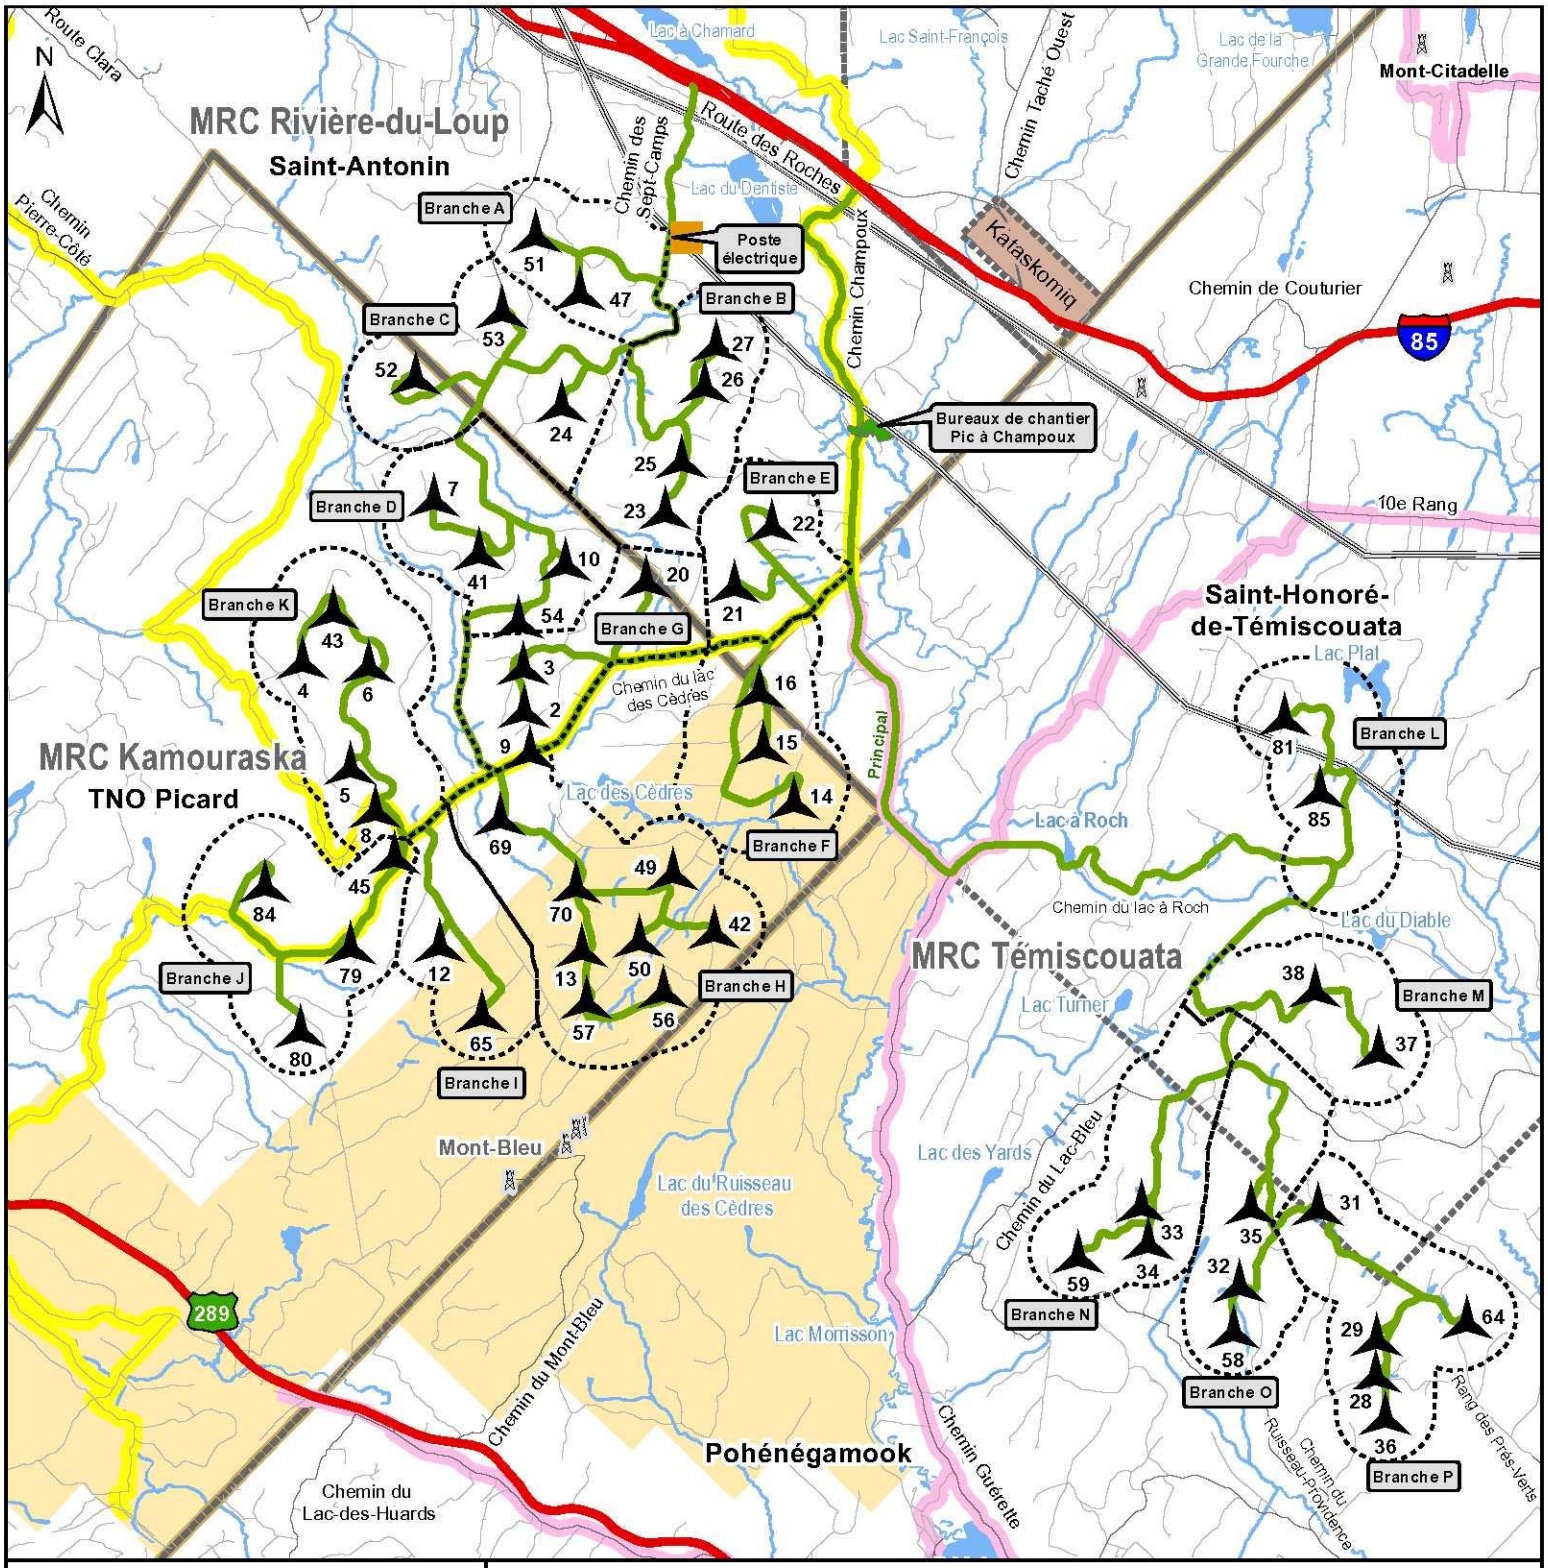

Invenergy

Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC

Sentier de VTT

- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur

0 1 2 4 Kilomètres

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7 *2025-06-05*

N/Réf.: PPAW_034B_WeeklyReports_20250605
