

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 1^{er} septembre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours**

- **TRAVAUX CIVILS:**
 - Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau): branches A, B, C, E, F, G, H, I, J et K
 - Dynamitage: branches H et K
 - Travaux de fondations au poste électrique
 - Construction de ligne électrique par Hydro-Québec
 - Travaux aux sites des fondations des éoliennes des branches A, B, C, E, F, G, H, I, J et K
 - Réseau collecteur: branches A et F
- **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur l'aire d'entreposage sur le Chemin de la Rivière Verte, près de l'Autoroute 85
- **FERMETURE DE ROUTE:** Courtes fermetures dans les zones sécurisées pour les dynamitages, émission de signaux sonores pour signifier la fermeture ponctuelle des routes
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables


CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement	Hiver 2025
48%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
19%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2025
24%	Livraison des composantes	Printemps 2025 – Été 2026
3%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
5%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
0%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

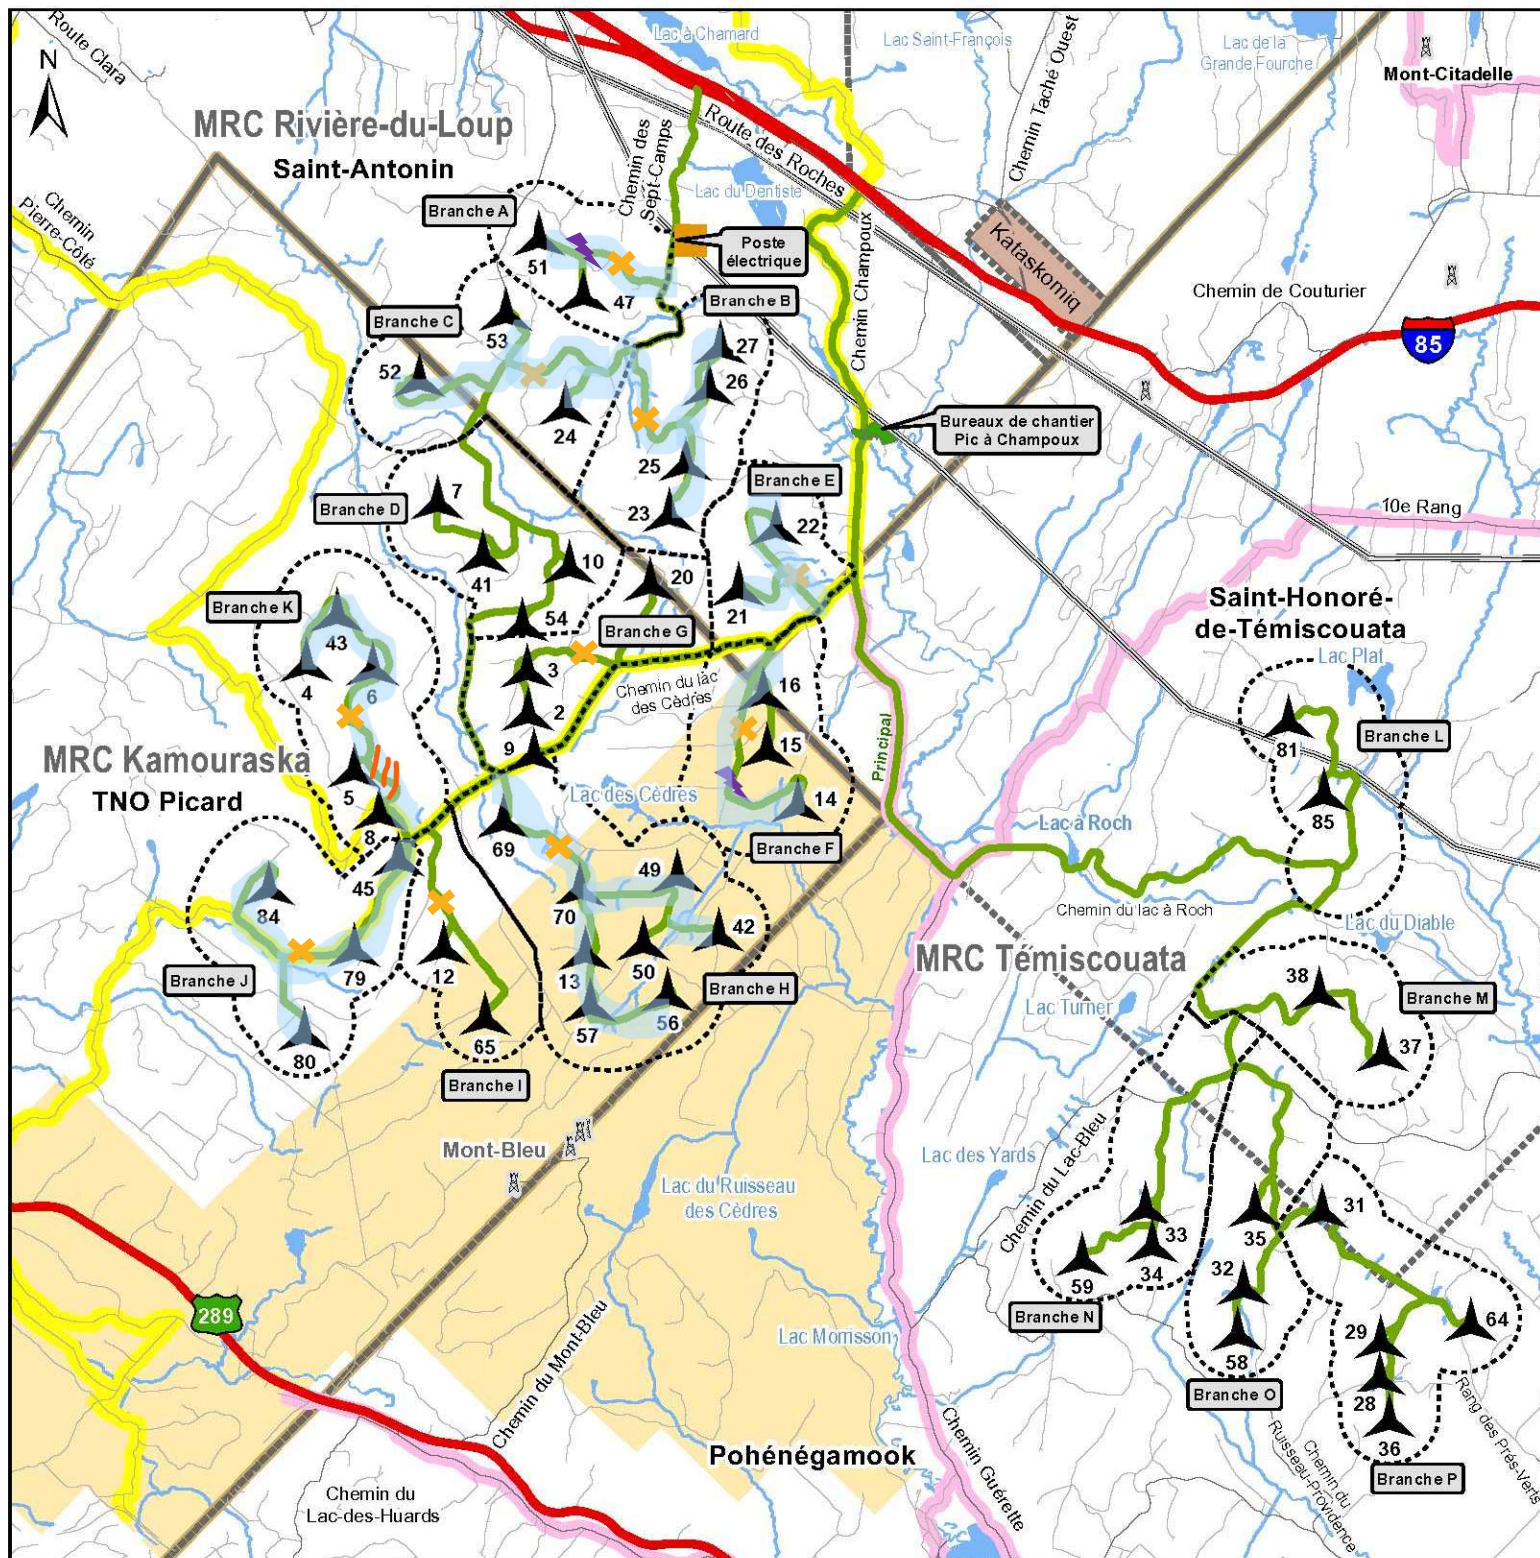

Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur
